



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA 2018 - 2021

*Sumando esfuerzos para mejores resultados*

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de TIERRA BLANCA del municipio de TIERRA BLANCA siendo las 12:00 horas del día 09 del mes de NOVIEMBRE del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

### Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

### Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C HUGO HERNANDEZ USCANGA (a) C. JOEL BELTRAN ALONSO; Vocal, C. MARIA ELENA HERNANDEZ ROSA y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.


El referido Comité número 204 corresponde a la obra pública: **AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PROL. AV. JUAREZ Y FCO. I MADERO, COL. OBRERA.**, Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 29 DE MARZO DE 2020.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTB-FISM-DF-DOP-2020301740007**, teniendo un monto total de inversión de \$ 114,706.69; la cual se adjudicó mediante modalidad: ADJUDICACION DIRECTA a la empresa: **INGENIERIA VERMEX S.A. DE C.V.**, representada por el mismo.

Con las siguientes características de la obra: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA TUBERIA, EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, CAMA DE ARENA APISONADA MANUALMENTE EN CEPAS, PARA DAR APOYO UNIFORME A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200mm (8") DE DIAMETRO , SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 150mm (6") DE DIAMETRO , SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC DE 8" X 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERÍA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M., PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M., RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS, CARGA Y ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA Y DEMOLICIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CAMION DE TIPO VOLTEO DE 7 M3 EN CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA), CARGA CON RETROEXCAVADORA YACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS EN TUBERIA EN CAMION TIPO VOLTEO DE 7 M3 SOBRE CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA).

La compañía afianzadora: **SOFIMEX** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada 09 de Noviembre de 2020.

*Fluor Alba*



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

*Sumando acciones con buenos resultados*

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.**- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.**- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

**CUARTO.**- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.



# H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

*Sumando esfuerzos para mejores resultados*


**POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.**

**PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**OBRAS PÚBLICAS  
2018-2021**

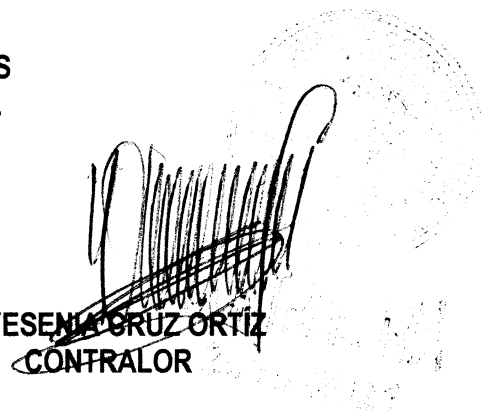

**C. YESENIA CRUZ ORTÍZ  
CONTRALOR**

**C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO**

**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

**C. HUGO HERNANDEZ USCANGA  
PRESIDENTE**

**C. ABEL BELTRAN ALONSO  
SECRETARIA**

**C. MARÍA ELENA HERNANDEZ ROSA  
VOCAL**
